



VERDELER	PV nagezeten
Naam	
Datum	
Handtekening	

428210212-3f.
 EAN nr.: 54.14.886000.98.65.802
 Teller nr.: 374447331
 Stand I: II:

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

WET- OF TIJDEBUREAU AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / ~~aanbouw~~
 op basis van de interne procedure OPRO/ELE/001
 volgens: AREI art. 65 / ~~AREI art. 270~~ / ~~AREI art. 270~~ / ~~AREI art. 270~~ / ~~AREI art. 270~~

Aanvulling verslag nr.
 Aard installatie: Nieuwe / ~~aanbouw~~
 Plaats van onderzoek: App. W. 01.02.
 Eigendom van: 4. El. Salaan, 60 - 8620 Nieuwpoort
 Opdrachtgever: NV. Elektriek - Schwy, 112 - 8600 Diksmuide
 Installateur: J. DEN
 BTW nr.: 42422578
 Onderzoeker: Callens Dirk
 Uitreikt te: Datum:
 Datum van onderzoek: 21-02-12

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V
 Hoofdbeveiliging: Zek. 40A aut. 3P
 Max. Beveiliging: 40A
 Omschakelaar, stand
 Schak. 40A 300 mA
 Meter-bordverbinding: kabeltype: X.V.B. aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm
 Voedingsbekabeling: kabeltype: aantal geleiders: doorsnede: mm
 Aardlektrode: Type: IJS / Sectie: 16 mm² Spreidingswaarde: 81,3 Ω
 Aantal boden: 1 Aantal eindstroombaren: 9 Algemene isolatieveerstand: 70 MΩ
 Diff. schak.: algemene: 40A 300 mA bijkomende: 40A 30 mA
 werking testknop: in orde - niet in orde
 controle foullus: in orde - niet in orde
 Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: ja - ~~nee~~
 Staat van het vast elektrisch materieel: in orde - ~~niet in orde~~
 Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde - ~~niet in orde~~
 onrechtstreekse aanraking: in orde - ~~niet in orde~~
 Continuität PE-en equipotentiële verbinding: in orde - ~~niet in orde~~
 Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde - ~~niet in orde~~
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - loestellen:

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

- N | Hoofdequipotentiële - bijkomende equipotentiële verbinding nog niet aangesloten
- N | Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.
- I | ~~.....~~

BESLUIT


De installatie is conform / ~~.....~~ met het AREI.
 De algemene differentieëlschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
 Het (de) enddraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien gelekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/02/2012, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 De installatie mag / ~~.....~~ in dienst gesteld worden / ~~.....~~
 erkend controle organisatie:
 vereniging zonder winstoogmerk:
 gerechtelijke zetel: in elke provincie:
 maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tel. 03/451 37 00
 Fax 03/451 37 10
 www.ocb.be
 info@ocb.be
 BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-302050149

[Handwritten signature]
 O.C.B.

NOTA ONDERNEMINGEN - Kwaliteitsart. 898 10 vth AFAB moet dit document het kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en milieubescherming van de werknemers.
 1) of proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie.
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier.
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken drie maanden vóór de afsluiting van de werkzaamheden te kennisgeven van de afsluiting van de werkzaamheden.

TV : - 1 x Living

UTP : - 1 x Living

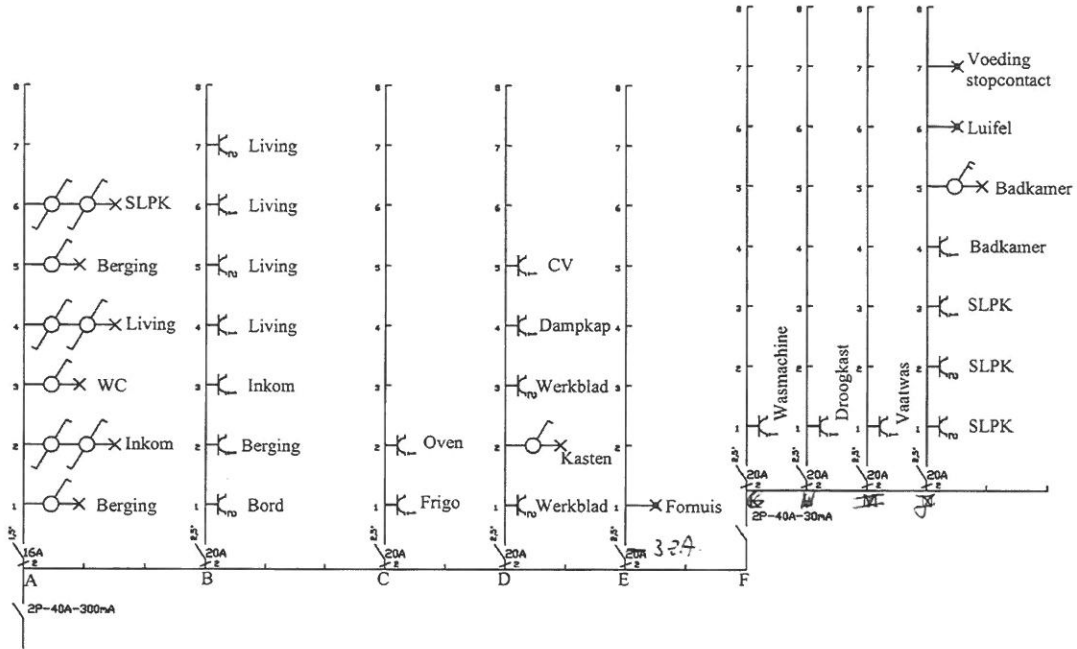

Installatie is gecontroleerd door:
 OCB, Kon Astridlaan 60, 2550 Kontich
 Onderzoeker CALLENS Dirk
 Datum 27/02/12
 PV nr. 428270212-3
 Handtekening:

EAN NUMMER: 54144886009865802	
Revisie: A	4 seizoenen
Datum: 14/02/2012	Elisalaan 60
APP.NR.: W 1.2	8620 Nieuwpoort
Werfnr : 11001	

ELEKTRIEK nv
 Esenweg 112
 8600 DIKSMUIDE
 BTW: BE444.242.578
